

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa w 2020 r. do 164 kpl. elementów betonowych zbrojonych do wykonania grobów oraz do 96 sztuk prefabrykatów żelbetowych na urny z pokrywami**, o wymiarach określonych w rysunkach stanowiących załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.

W/w ilości są maksymalne, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych w przedmiocie zamówienia, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych, określonych w ofercie, z jednoczesnym prawem do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia.

2. W/w przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy użyciu niżej określonych materiałów:
 - a) beton klasy C40/45
 - b) stal zbrojeniowa: klasy AIII, A-0
 - użyta stal żebro o średnicy: fi 6mm oraz fi 8mm
 - siatka zbrojenia boczna: 12x24cm
 - siatka zbrojenia felca: 7x24cm
 - c) otulina zbrojenia >25mm
 - d) wodoszczelność W8
 - e) nasiąkliwość <5%

Zastosowane materiały (beton, stal) muszą posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające jakość zastosowanych materiałów.

3. Dostawa w/w elementów odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego **od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.**
4. Ilość przedmiotu zamówienia Zamawiający oznaczy każdorazowo w odrębnym zamówieniu przekazany Wykonawcy.
5. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: siedziba ZUM „Muniserwis” Z.B., Płock, ul. Przemysłowa 33 lub Cmentarz komunalny w Płocku, ul. Bielska 66.

6. Termin realizacji każdorazowych zamówień – **nie dłużej niż 30 dni roboczych**, liczonych od daty przekazania zamówienia przez Zamawiającego.

7. Wykonawca musi dysponować sprzętem niezbędnym do załadunku, przewozu i rozładunku przedmiotu zamówienia.

UWAGA!

Cena kpl. elementów betonowych zbrojonych do wykonania grobu oraz prefabrykatu żelbetowego na urnę z pokrywą podana w ofercie będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia jedynie w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT.

Załączniki:

1. Rysunek grobowca monolitycznego składającego się z 7 elementów
2. Rysunek prefabrykatu grobu na urnę z pokrywą


w zastępstwie Dyrektora
Dorota Tokarska
Zastępca Dyrektora
ds. rozliczeń finansowych

GROBOWIEC MONOLITYCZNY

ZAKŁADNIK NR 1

DO OPISU POCZĘTYCH ZAM.


Zestaw grobowca monolitycznego składa się z 7 elementów

Konstrukcja - monolit (1szt)

Płyty sklepieniowe pełne - (5szt)

Płyty sklepieniowe cięte - (1szt)

plyta sklepieniowa cięta
88x25x6cm (1szt)

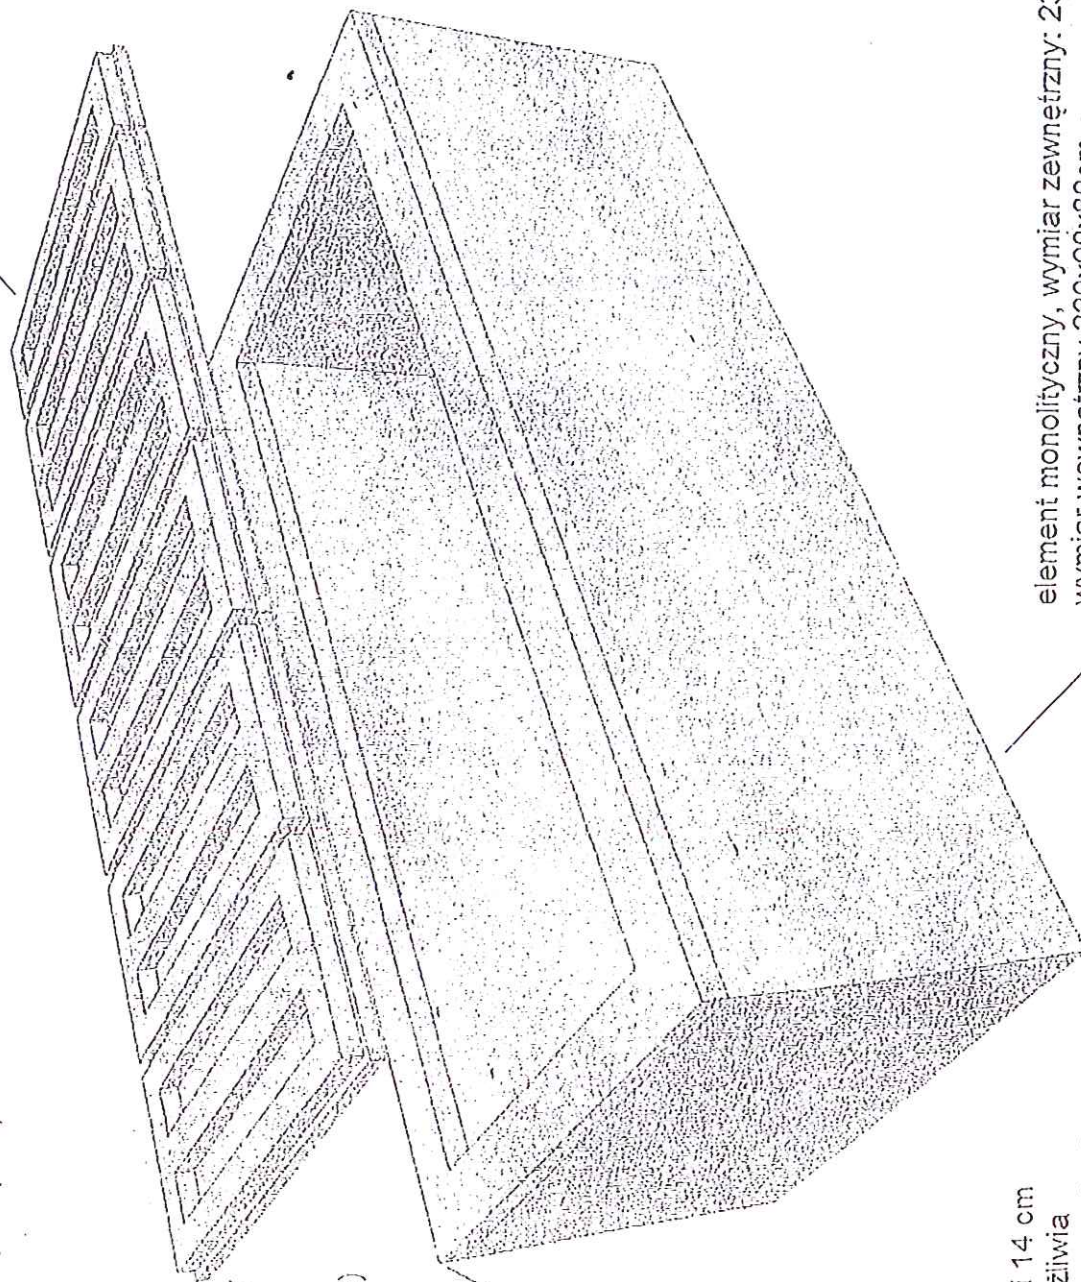

plyta sklepieniowa
pełna 88x40x6cm (5szt)

element monolityczny, wymiar zewnętrzny: 238x108x80cm,
wymiar wewnętrzny 220x90x80cm

kołnierz o szerokości 14 cm
ułatwia montaż, umożliwia
bezpieczne i stabilne posadowienie
nagrobka

