

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa w 2022 r. do 100 kompletów elementów betonowych zbrojonych do wykonania grobów oraz do 90 sztuk prefabrykatów żelbetowych na urny z pokrywami**, o wymiarach określonych w rysunkach stanowiących załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.

W/w ilości są maksymalne, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilościowych w przedmiocie zamówienia, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych, określonych w ofercie, z jednoczesnym prawem do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia, zgodnie z zapisami umowy.

2. W/w przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy użyciu niżej określonych materiałów:

a) beton klasy C40/45

b) stal zbrojeniowa: klasy AIII, A-0

- użyta stal żebro o średnicy: fi 6mm oraz fi 8mm
- siatka zbrojenia boczna: 12x24cm
- siatka zbrojenia felca: 7x24cm

c) otulina zbrojenia >25mm

d) wodoszczelność W8

e) nasiąkliwość <5%

Zastosowane materiały (beton, stal) muszą posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające jakość zastosowanych materiałów.

3. Dostawa w/w elementów odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego **od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.**

4. Ilość i rodzaj przedmiotu zamówienia Zamawiający oznaczy każdorazowo w odrębnym zamówieniu przekazanym Wykonawcy.

5. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Cmentarz komunalny w Płocku, ul. Bielska 66, w godz. 8 00 – 15 00 od poniedziałku do piątku.

6. Termin realizacji zamówienia – **do 30 dni roboczych**, liczonych od daty przekazania zamówienia przez Zamawiającego.

7. Wykonawca musi dysponować sprzętem niezbędnym do załadunku, przewozu i rozładunku przedmiotu zamówienia.

### **Uwaga!**

Cena kompletu elementów betonowych zbrojonych do wykonania grobu oraz prefabrykatu żelbetowego na urnę z pokrywą podana w ofercie będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia jedynie w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT.

Załączniki:

1. Rysunek grobowca monolitycznego składającego się z 7 elementów
2. Rysunek prefabrykatu grobu na urnę z pokrywą

Dyrektor  
  
Zbigniew Idzik

## GROBOWIEC MONOLITYCZNY

Zestaw grobowca monolitycznego składa się z 6 elementów:

Konstrukcja grobowca - monolit (1szt)


Płyty sklepieniowe (5szt)

ułatwia

Płyta sklepieniowa wymiar:  
92x46x6cm (x 5szt)

Kołnierz górny o szerokości 14cm  
ułatwia montaż, umożliwia  
bezpieczne i stabilne posadowienie  
nagrobka

Wymiar w świetle kołnierza: 221x81cm

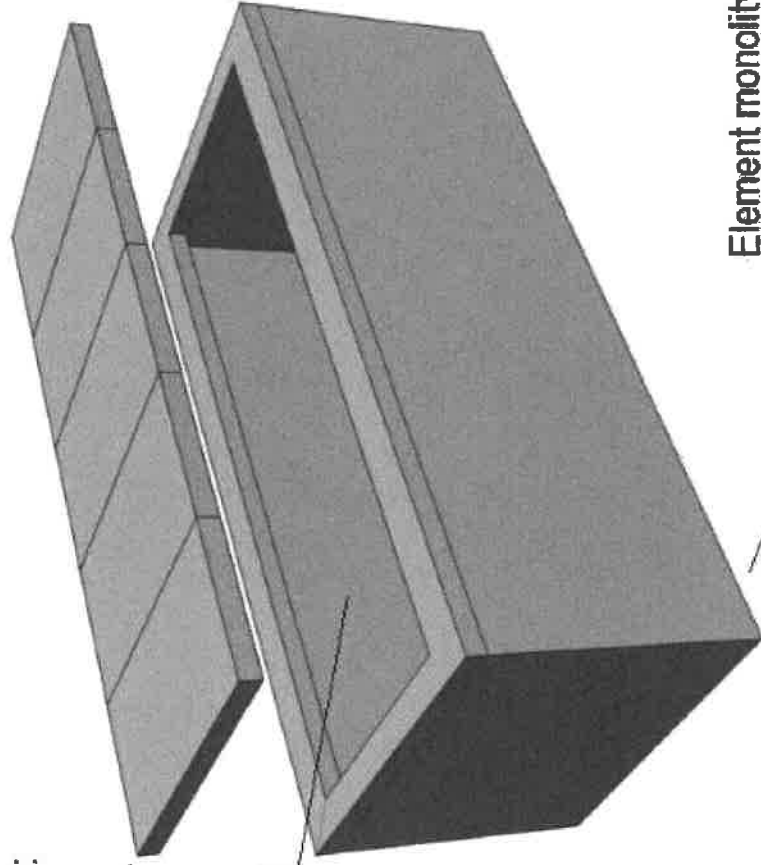

Element monolityczny:

- wymiar zewnętrzny: 241x109x87cm


- wymiar wewnętrzny: 220x90x87cm



ZAKŁĄCZNIK N° 2  
DO OPISU PRZEDMIOTU ZAM.




# PRZEFABRYKAT GROBU NA URNE

SKALA 1:10

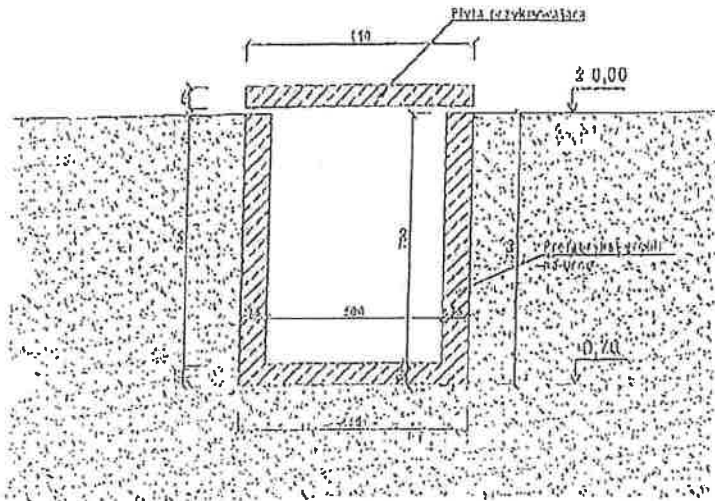

PRZEKRÓJ A-A

RZUT Z GÓRY

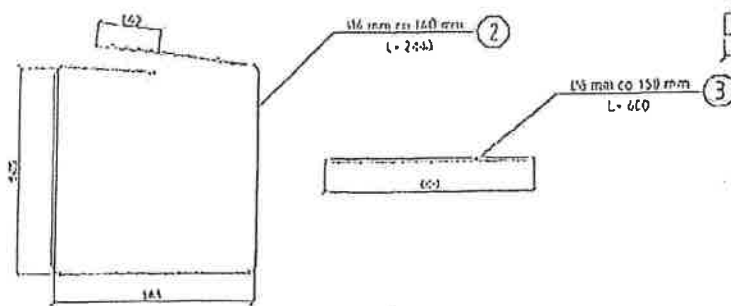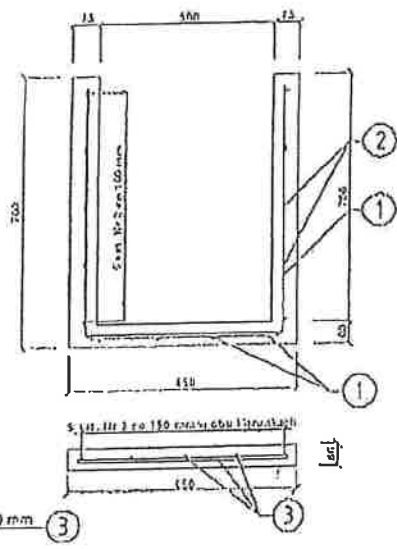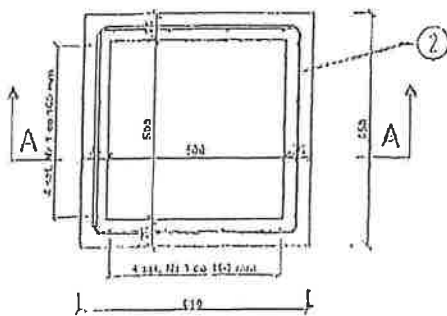

Dyrektor  
Zbigniew Idzik

